ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Κορυδαλλός, 13.11.2026
Αριθμ. Πρωτ.: 30

ΘΕΜΑ: «Επαναλειτουργία του **1ου ΕΠΑΛ**, των τμημάτων του **ΣΕΑΚ Κορυδαλλού και του 6ου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ**»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Ο Δήμαρχος,

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 4 εδ. 27. του Ν. 3852/2010 ΄΄Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης΄΄ (Α΄ 87).
2. Το υπ΄αρ. έγγραφο με αρ. πρωτ. 29/13-11-2026.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

την επαναλειτουργία του 1ου ΕΠΑΛ, των τμημάτων του ΣΑΕΚ Κορυδαλλού και του 6ου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Α' ΠΕΙΡΑΙΑ μετά την ολοκλήρωση των έλεγχων και των απαιτούμενων δοκιμών από πιστοποιημένο φορέα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΟΥΡΣΑΛΑΣ

Κοινοποίηση:

1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής,
2. Διεύθυνση Β΄ βάθμιας Εκπαίδευσης,
3. ΕΠΑΛ Κορυδαλλού
4. Γραφείο Παιδείας Δήμου.

airfire
THE FIRE SAFETY EXPERTS

ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ISO 9001
LL-C (Certification)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 29
ΗΜΕΡ. 13/11/2026

Προς ΔΗΜΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΑΦΟΡΑ 1ο ΕΠΑΛ - Κ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 68-70, ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 13-11-2026

ΘΕΜΑ : ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΕΠΑΛ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Αξιότιμοι κύριοι,

Κατόπιν της ενημέρωσης που λάβαμε απο μέρους σας, στις 11/11/2026 αναφορικά με την ενεργοποίηση του συστήματος αερίων του εργαστηρίου στο 1ο ΕΠΑΛ Κορυδαλλού, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε τα εξής :

Πραγματοποιήθηκε άμεσα επίσκεψη – αυτοψία του τεχνικού μας στο χώρο του σχολείου στις 12/11/2026 το πρωί. Πρόκειται για μια αίθουσα εργαστηρίου, στον εξωτερικό χώρο της οποίας είναι τοποθετημένες 2 φιάλες υγραερίου οι οποίες καταλήγουν συνδεδεμένες σε ένα κολεκτέρ 2 φιαλών (κολεκτερ 2 φιαλών με αναμονή άλλες 2 φιάλες - δείτε Φωτογραφία No 1). Μέσα στην αίθουσα, το κυρίως δίκτυο αποτελείται απο χαλύβδινες σωλήνες βαρέως τύπου με εξαρτήματα συνδέσεως 3000lbs με διακόπτες ½'' αερίου, ενώ απο τους διακόπτες υπάρχουν κόκκινες ελαστικές σωλήνες αερίου για τη σύνδεση των φλόγιστρων (αυτή τη στιγμή είναι συνδεδεμένα 7 φλόγιστρα). Οι εν λόγω σωλήνες τρέχουν απο τη μια και την άλλη πλευρά και συνδέονται στους πάγκους εργασίας των μαθητών.

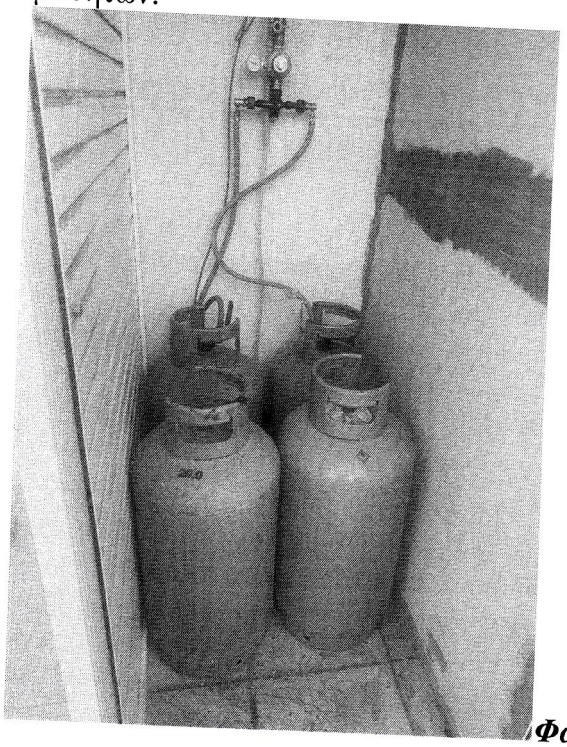


Φωτογραφία No 1.


Info@airfire.gr
www.airfire.gr
Φωκίωνος 60 & Παλαμηδίου
Πειραιάς 18545
+30 210 4212241
+30 210 4212242

Ο τεχνικός προέβει σε έλεγχο του συστηματος ανίχνευσης αερίων του χώρου (το οποίο είχε εγκατασταθεί απο την εταιρία μας περσι) , του πίνακα και των ανιχνευτών. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το σύστημα ενεργοποιηθηκε ορθά καθώς οι ανιχνευτές παρουσίαζαν ενδειξη διαρροής αερίου. Ενημερωθήκαμε δε ότι μετα την ενεργοποιηση του συστηματος ακολουθηθηκε η διαδικασία πρωτοκόλλου, έγινε διακοπή της παροχής , εκκενώθηκε ο χώρος για λόγους ασφάλειας. Ενω παράλληλα πραγματοποιηθηκε reset του συστηματος ώστε να σταματησει να ηχεί.

Μετα απο επικοινωνία με τις τεχνικές υπηρεσίες του Δημου και τους διευθυντές του σχολείου , λάβαμε εντόλη να προβούμε σε εκτενέστερο ελεγχο του δικτύου γραμμών του συστηματος αερίου.

Πρόκειται για μια εγκατασταση υφιστάμενη η οποία δεν εχει γινει απο την εταιρια μας αλλα κατόπιν εντολής των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου προχωρήσαμε σε πλήρη έλεγχο γραμμων και δικτύου. Κατα τον έλεγχο των γραμμων διαπιστωθηκε διαρροή αερίου .Κατόπιν εντόλης του Δήμου και των τεχνικών υπηρεσιών ζητηθηκε να προβούμε σε αποκατασταση της βλάβης και του συστηματος , κάνοντας οποιαδηποτε αλλαγη κρίνεται απαραίτητη για την ομαλή και την ασφαλη αποκατασταση του συστηματος . Ο τεχνικός προέβη σε αλλαγή των κόκκινων ελαστικών σωληνών και τα παρεμβύσματα αυτών,του ρυθμιστή υψηλής πίεσης, της ηλεκτροβάνας και του πηνίου. Τα συγκεκειμένα ανταλλακτικά αντικαταστάθηκαν κυρίως λόγω ευαισθησίας αισθητήρων , δεδομενου ότι ενεργοποιηθηκαν και πρόκειται για ευαισθητα ανταλλακτικά , προκειμένου να είμαστε σίγουροι ότι λόγω ευαισθησίας των αισθητήρων δεν θα ενεργοποιηθούν μελλοντικά άσκοπα. Μετα την αλλαγη ο τεχνικός προέβει σε πλήρη ελεγχο ξανα του δικτύου όπου και διαπιστωθηκε η στεγανότητα του συστηματος.

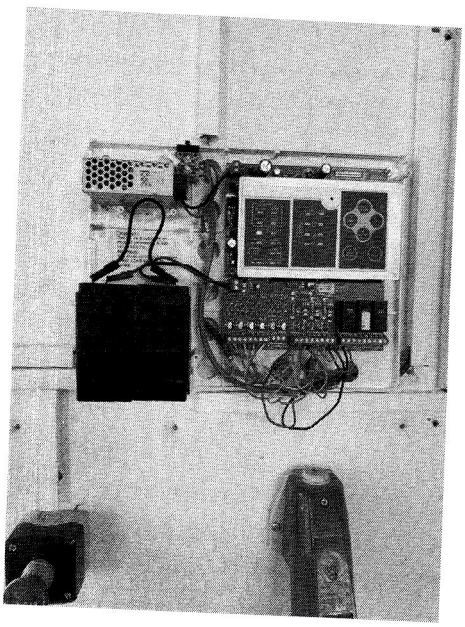

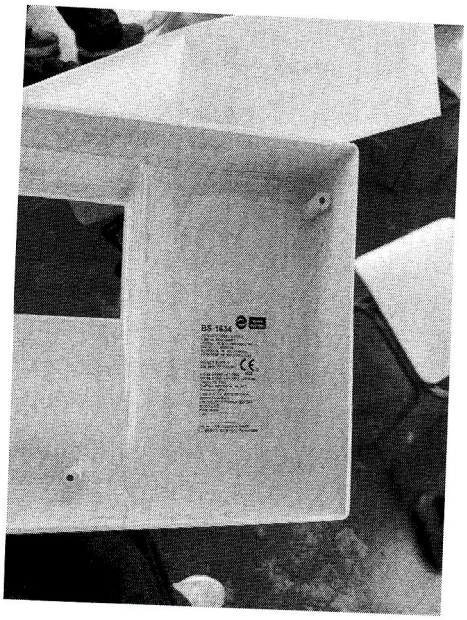



Φωτογραφίες Νο 2-4.

airfire
THE FIRE SAFETY EXPERTS

ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Στην συνέχεια στις 13-11-2026 ο τεχνικός της εταιριας μας ενημέρωσε τον Δημαρχο , τον Αξιωματικό του 2ου Πυροσβεστικού Σταθμού Πειραιά , τους μηχανικούς του Δήμου και τους διευθυντές των σχολείων για τις εργασίες που πραγματοποιηθηκαν και παρέδωσε το συστημα ενεργοποιημένο και πλήρως λειτουργικό.

Είμαστε πάντα στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

Με εκτίμηση,
Για την AIR FIRE HELLAS A.E,

AIR FIRE HELLAS A.E.
ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΠΛΑΜΗΛΙΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΑΦΜ: 99[illegible] ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: [illegible]
ΤΗΛ. 210 [illegible] - FAX: 210 4212243
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 000449713070

EN ISO 9001:2015 | *EN ISO 14001:2015* | *EN ISO 27001:2013* | *EN ISO 45001:2018*

Info@airfire.gr
www.airfire.gr
Φωκίωνος 60 & Παλαμηδίου
Πειραιάς 18545
+30 210 4212241
+30 210 4212242
